



PROGRESS REPORT

September سبتمبر
2024 ٢٠٢٤

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
بوشر - شارع المها التجاري

الأعمال المنجزة

Work Performed

إكمال أعمال الصبغ والديكور الداخلي للشقق
Interior painting and decor completed.

1

استمرار تركيب المطابخ
Kitchen installation ongoing.

2

إكمال أعمال تركيب الألمنيوم للنوافذ والبلكونات
Aluminum installation for windows and balconies
completed.

3

استمرار أعمال الصبغ الخارجي للمشروع
Ongoing exterior paint work.

4

8377.7 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE

97%

مقاول المشروع
تثمير للمشاريع الشاملة



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project

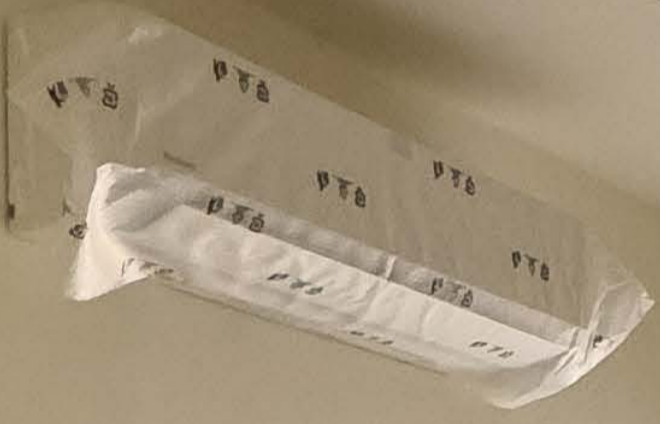

لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطاتٌ من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





ريثنا
RAYANA



10 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



6 دقائق إلى
مسقط جراند مول



4 دقائق إلى
شارع مسقط السريع



4 دقائق إلى
مول عُمان

شارع المها التجاري
AlMaha St. Bowsher

تتمير للمشاريع
الشاملة



مقاوم
المشروع

تتمير العقارية



المطور
العقاري

أكتوبر 2024



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME
